Comune di STROPPO, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte

Rinforzo e consolidamento muri di contenimento

in Frazione Bassura

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA allegato D.a.

RS Studio associato di Ingegneria di Raina Marco e Sacco Paolo C.so Giolitti 4 BUSCA (CN) Partita IVA 02252390048
tel 0171944594; fax 0171948142; e-mail: staff@rs-ing.it www.rs-ing.it, postacert: rs-ing@eticert.it
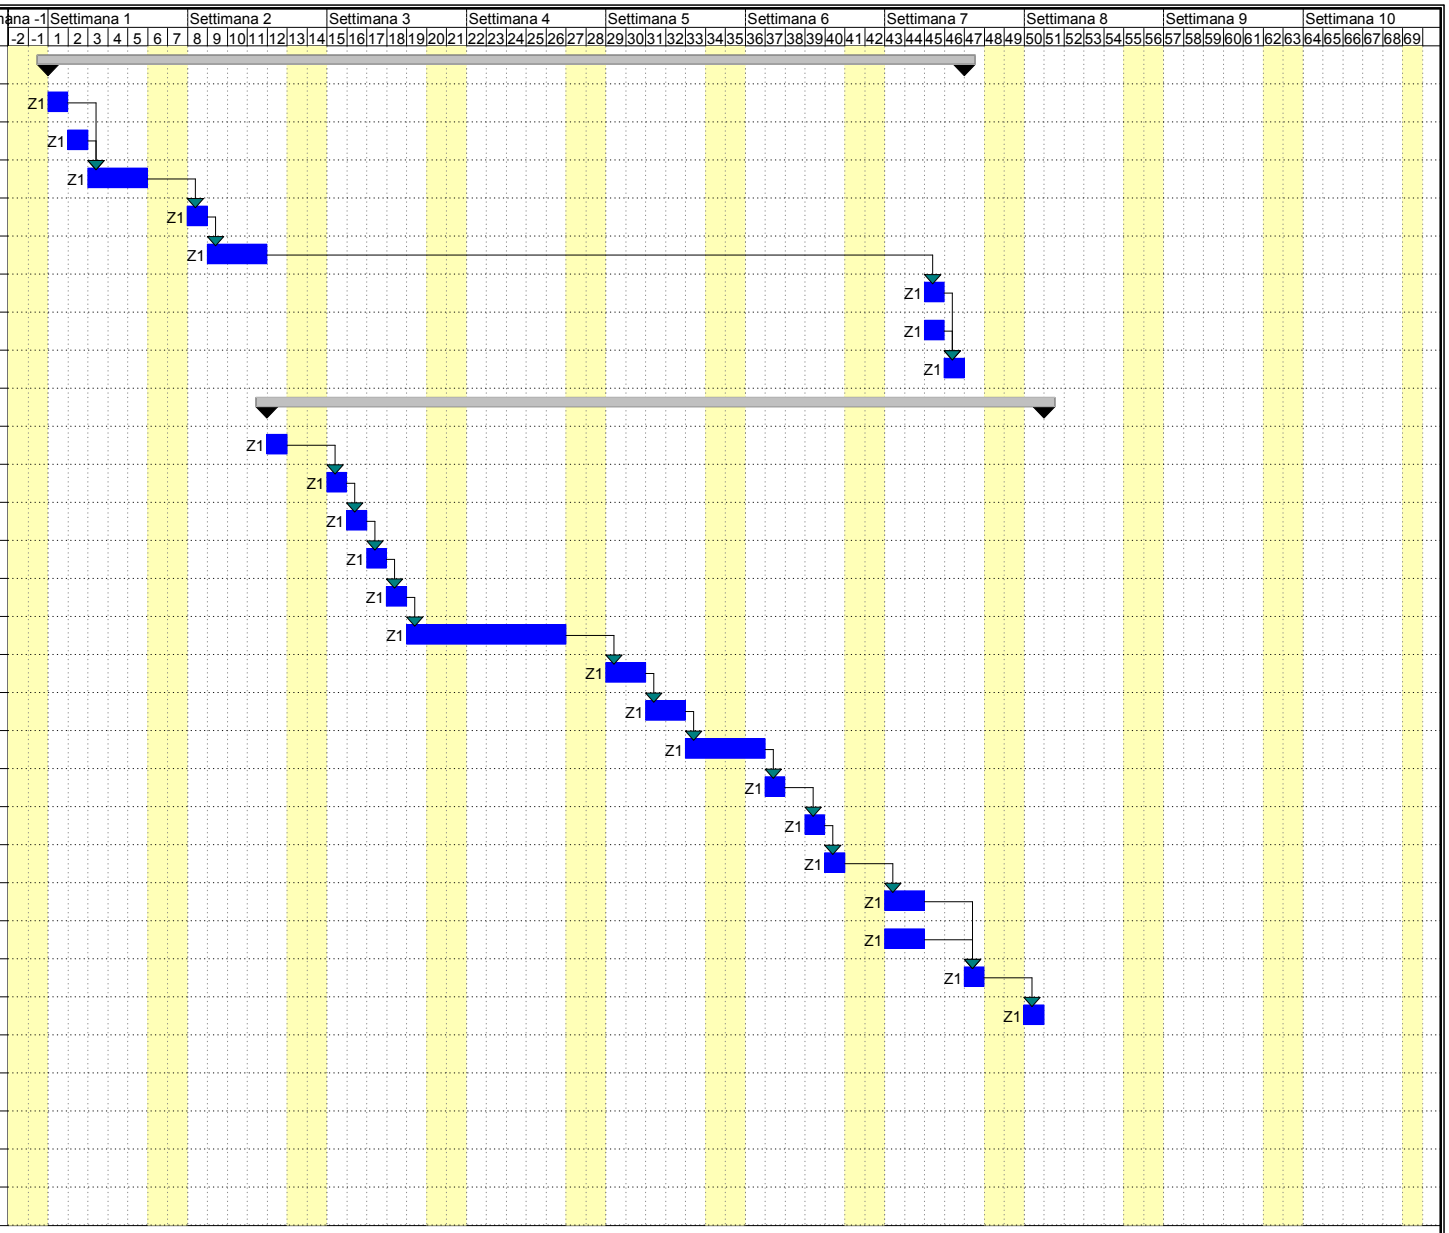
Nome attività	Durata
Campo bocce	34 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Rimozione scala di accesso "campo bocce"	1 g
Demolizione muro	3 g
Scavo	1 g
Sistemazione scarpata	3 g
Scarifica del manto stradale	1 g
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
Piazza Guglielmi	27 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1 g
Rimozione di ringhiera	1 g
Scarifica del manto stradale	1 g
Scavo	1 g
Realizzazione di micropali in acciaio	6 g
Demolizione porzione di muro	2 g
Realizzazione della carpenteria per i cordoli in c.a.	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per i cordoli in c.a.	2 g
Getto in calcestruzzo per i cordoli in c.a.	1 g
Posa di ringhiera	1 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g
Posa caditoie	2 g
Posa di condotta acque bianche	2 g
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA
